



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:26:16 AM

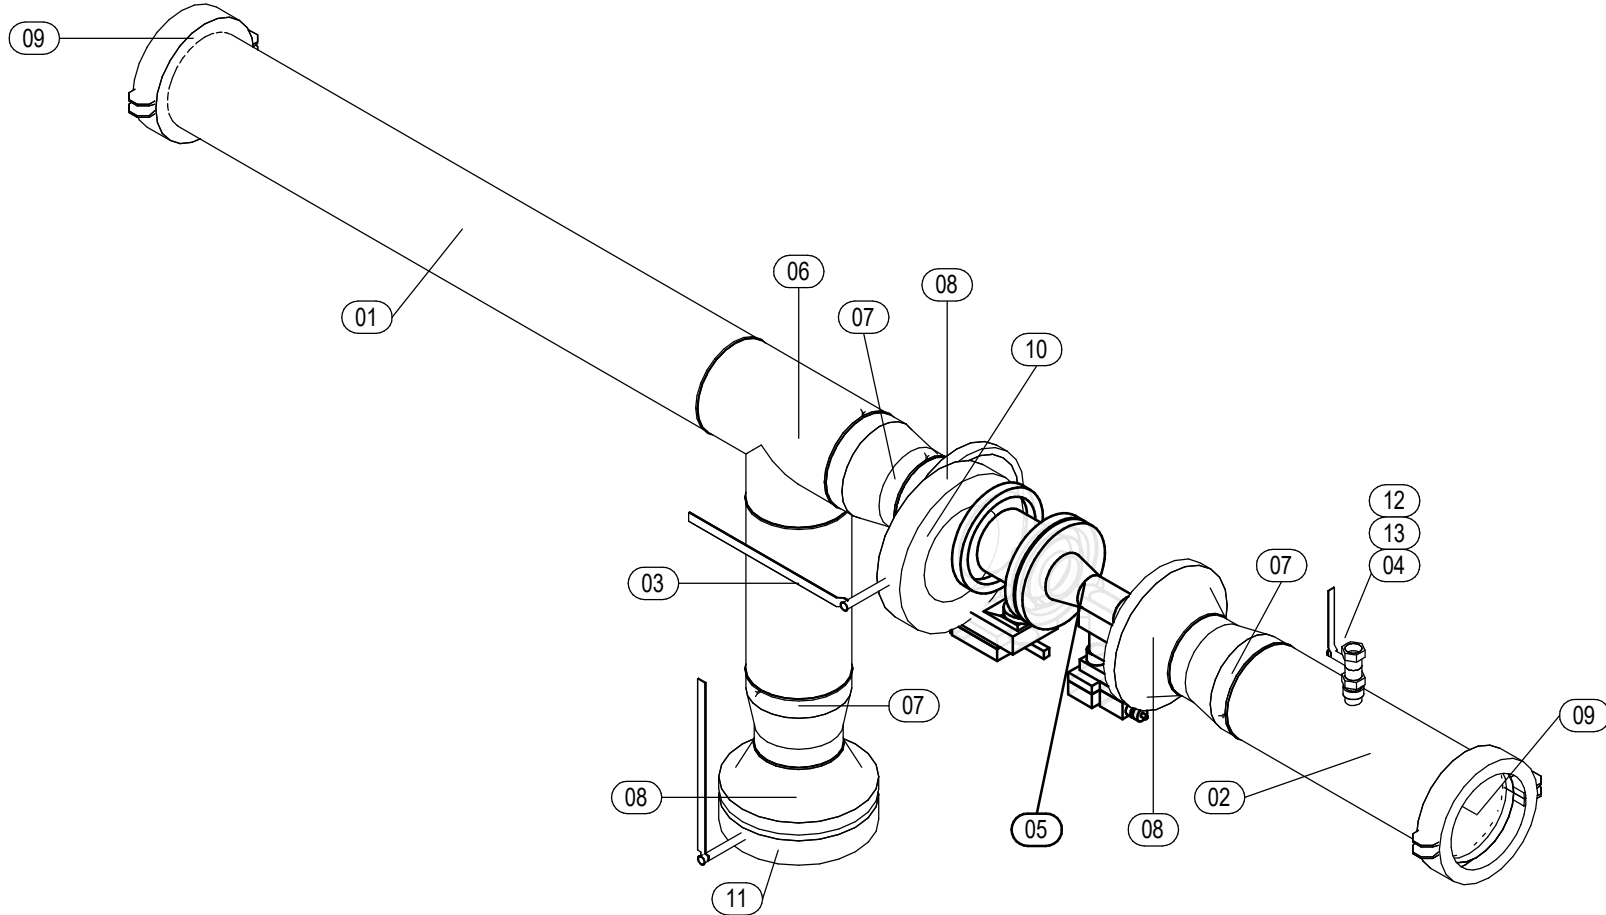

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	4'-0"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-6 11/16"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-1"	1"
04	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
05	1	2-Way ePIV Flanged Ball Valve with Flow Meter	6"		0"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	6"		1"
07	3	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	6"x5"		1"
08	3	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	5"		1"
09	2	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
10	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	6"		1"
11	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	5"		1"
12	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
13	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"


3D Ortho

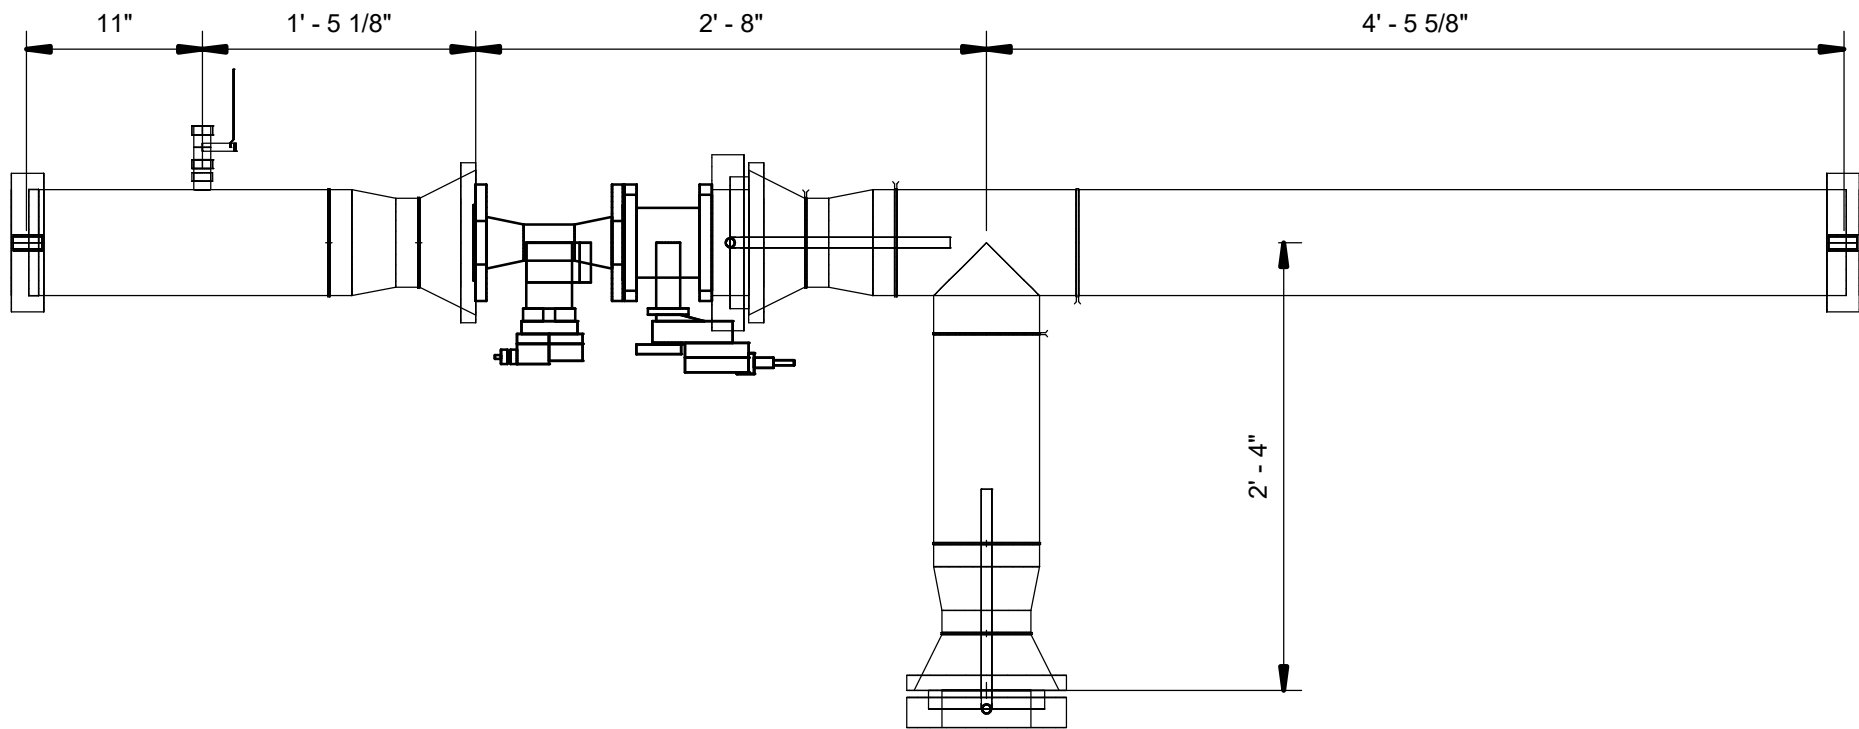

Elevation Back
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-284
Drawn By: Author
DATE: 10/21/21
DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone
